

OBSERVACIÓN 3

Posible retraso en el cumplimiento del indicador asociado a la meta sectorial 205 del Plan Distrital de Desarrollo 2020-2024.

El macroproyecto 0081 Corredores Ambientales, se encuentra estructurado con el objeto de alcanzar las metas e indicadores planificados en el marco del Plan Distrital de Desarrollo 2020 – 2024, para la consecución de los mismos la EAAB-ESP ha suscrito contratos de Consultoría, Obra Civil, Interventoría y de Prestación de servicios, estos últimos con afectación al presupuesto de funcionamiento o de inversión desde el año 2016; por lo anterior, estos fueron objeto de verificación en el desarrollo de esta auditoría.

Así las cosas, con la documentación allegada por el área auditada se confrontó con la obtenida del Sistema de Información Empresarial SAP, mediante la transacción ZMM76A Informe General Contratos: obteniendo **161** contratos de prestación de servicios liderados por la Gerencia Corporativa de Sistema Maestro asociados al Macroproyecto 0081 Corredores Ambientales del periodo comprendido entre el 25 de noviembre de 2016 hasta el 14 de septiembre de 2022, discriminados así:

CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS 2016 - 2022			
ESTADO DEL CONTRATO A OCTUBRE 03 DE 2022	TOTAL CONTRATOS	VALOR CONTRATO	VALOR GIRADO
En Ejecución	19	\$ 1.527.357.500	\$ 1.200.983.283
Terminados	109	\$ 7.591.627.773	\$ 6.683.431.426
Liquidados	33	\$ 2.511.496.189	\$ 2.433.294.274
TOTAL		\$ 11.630.481.462	\$ 10.317.708.983

Tabla 1. Fuente OCIG

Sobre este particular, los contratos suscritos fueron 161 y la ejecución presupuestal corresponde al 88.71%.

Adicionalmente, de conformidad, con la base allegada por la Dirección Planeamiento y Control de Inversiones correspondiente al seguimiento de los proyectos de inversión del Plan Distrital de desarrollo 2020–2024, con corte a septiembre de 2022 se analizaron los indicadores del Macroproyecto 0081; Dado lo anterior se realizaron entrevistas con los supervisores designados para los contratos de interventoría, requiriéndose información adicional al área objeto de auditoría a fin de verificar el estado de ejecución de los proyectos asociados a corredores ambientales, con respecto a lo planificado inicialmente.

En desarrollo de lo anterior, el equipo auditor considero pertinente efectuar reuniones con la Dirección Información Técnica y Geográfica – DITG, la Oficina Asesoría Legal y la Oficina Asesora Representación Judicial y Actuación Administrativa a fin de conocer las actuaciones administrativas relacionadas con el Macroproyecto 0081.

De esta manera, se identificó el estado de los contratos asociados al Macroproyecto 0081 Corredores Ambientales, así:

1. PARQUE LINEAL RÍO FUCHA

NUM	CLASE DE CONTRATO	NUMERO DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE CONTRATISTA	PLAZO INICIAL	FECHA DE INICIO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL GIRADO CONTRATO	ESTADO DEL CONTRATO A OCT 03	OBSERVACION
1	CONSULTORIA	2-02-25100-0828-2016	ACTUALIZACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PLANTEAMIENTO GENERAL DEL CORREDOR AMBIENTAL DEL RÍO FUCHA	CASTRO ARQUITECTOS - DISEÑO, ARQUITECTURA Y CIUDAD SAS	3 MESES	2/01/2017	\$ 657.879.537	\$ 657.879.535	Liquidado	
2	CONSULTORIA	2-02-25100-0648-2017	ELABORACION DE LOS DISEÑOS DETALLADOS ARQUITECTONICOS, URBANISTICOS Y PAISAJISTICOS DEL BORDE NORTE DEL CORREDOR AMBIENTAL RIO FUCHA	CASTRO ARQUITECTOS - DISEÑO, ARQUITECTURA Y CIUDAD SAS	7 MESES	1/08/2017	\$ 660.067.367	\$ 547.815.976	Liquidado	
3	CONSULTORIA	1-02-25100-0819-2017	ELABORACION DE LOS DISEÑOS TECNICOS DETALLADOS DEL BORDE NORTE DEL CORREDOR AMBIENTAL RIO FUCHA	TAYFER DE COLOMBIA LTDA	6 MESES	27/09/2017	\$ 810.937.000	\$ -	En Ejecución	ACCIÓN DE CONTROVERSIA CONTRACTUALES JUZGADO 66 ADMINISTRATIVO DE LA SECCIÓN TERCERA DE BOGOTÁ 11001334306420200008700
4	CONSULTORIA	2-02-25100-0726-2017	ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS ESTRUCTURALES Y GEOTÉCNICOS DETALLADOS DEL BORDE NORTE DEL CORREDOR AMBIENTAL RÍO FUCHA	PROYECTOS Y DISEÑOS SAS	7 MESES	22/08/2017	\$ 605.669.359	\$ 596.564.550	Liquidado	
5	INTERVENTORI A CONSULTORIA	2-15-25100-0688-2017	INTERVENTORIA PARA LOS DISEÑOS DETALLADOS ARQUITECTÓNICOS Y TÉCNICOS DE	MAB INGENIERIA DE VALOR	8 MESES	1/08/2017	\$ 450.667.464	\$ 374.182.753	Liquidado	

1. PARQUE LINEAL RÍO FUCHA

NUM	CLASE DE CONTRATO	NUMERO DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE CONTRATISTA	PLAZO INICIAL	FECHA DE INICIO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL GIRADO CONTRATO	ESTADO DEL CONTRATO A OCT 03	OBSERVACION
			BORDE NORTE DEL PLAN GENERAL DEL PROYECTO CORREDOR AMBIENTAL RÍO FUCHA.							
6	CONSULTORIA	2-02-25100-0693-2017	IDENTIFICACION DE LOS PREDIOS Y ELABORACION DE LAS FICHAS DE CADA UNO, CON TODOS LOS DETALLES LEGALES, TECNICOS Y FINANCIEROS PARA LA ADQUISICION DE LOS MISMOS DEL CORREDOR AMBIENTAL RIO FUCHA	GEOVALORES SAS	4 MESES	24/07/2017	\$ 240.000.000	\$ 240.000.000	Liquidado	
7	CONSULTORIA	2-02-25100-0730-2017	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE TRÁFICO DEL CORREDOR AMBIENTAL RÍO FUCHA	CONSULTORES EN MOVILIDAD S.A.S	3 MESES	22/08/2017	\$ 161.262.511	\$ 161.262.508	Liquidado	
8	OBRA CIVIL	1-01-25100-0738-2019	COMPLEMENTACIÓN Y AJUSTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS 3, 4, 5 Y 6 DEL CORREDOR AMBIENTAL DEL RIO FUCHA GRUPO 1 COMPLEMENTACIÓN Y AJUSTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y	CONSORCIO FUCHA IPD	19 MESES	30/08/2019	\$ 29.502.341.895	\$ 165.338.017	Terminado	Solamente se ejecutó la consultoría, la obra no se adelantará por negación de permisos ambientales por parte de las Secretaría Distrital de Ambiente

1. PARQUE LINEAL RÍO FUCHA

NUM	CLASE DE CONTRATO	NUMERO DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE CONTRATISTA	PLAZO INICIAL	FECHA DE INICIO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL GIRADO CONTRATO	ESTADO DEL CONTRATO A OCT 03	OBSERVACION
			CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO 3 DEL CORREDOR AMBIENTAL DEL RIO FUCHA							
9	OBRA CIVIL	1-01-25100-0736-2019	COMPLEMENTACIÓN Y AJUSTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS 3, 4, 5 Y 6 DEL CORREDOR AMBIENTAL DEL RIO FUCHA GRUPO 2 COMPLEMENTACIÓN Y AJUSTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS 4 Y 5 DEL CORREDOR AMBIENTAL DEL RIO FUCHA	CONSORCIO CCA FUCHA	19 MESES	30/08/2019	\$ 37.453.860.682	\$ 244.122.798	Terminado	Solamente se ejecutó la consultoría, la obra no se adelantará por negación de permisos ambientales por parte de las Secretaría Distrital de Ambiente
10	OBRA CIVIL	1-01-25100-0741-2019	COMPLEMENTACIÓN Y AJUSTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS 3, 4, 5 Y 6 DEL CORREDOR AMBIENTAL DEL RIO FUCHA GRUPO 3 COMPLEMENTACIÓN Y AJUSTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN	CONSORCIO CORREDOR AMBIENTAL FUCHA	19 MESES	30/08/2019	\$ 39.632.928.187	\$ 129.300.000	Terminado	Solamente se ejecutó la consultoría, la obra no se adelantará por negación de permisos ambientales por parte de las Secretaría Distrital de Ambiente

1. PARQUE LINEAL RÍO FUCHA

NUM	CLASE DE CONTRATO	NUMERO DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE CONTRATISTA	PLAZO INICIAL	FECHA DE INICIO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL GIRADO CONTRATO	ESTADO DEL CONTRATO A OCT 03	OBSERVACION
			DEL TRAMO 6 DEL CORREDOR AMBIENTAL DEL RIO FUCHA ETAPA 1							
11	INTERVENTORIA OBRA	1-15-25100-0747-2019	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURIDICA A LOS CONTRATOS QUE TIENEN POR OBJETO COMPLEMENTACION Y AJUSTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y CONSTRUCCION DE LOS TRAMOS 3,4,5 Y 6 DEL CORREDOR AMBIENTAL DEL RIO FUCHA	CONSORCIO INTERFUCHA - AMBIENTAL	20 MESES	30/08/2019	\$ 820.863.750	\$ -	Suspendido	Solamente se ejecutó la consultoría, la obra no se adelantará por negación de permisos ambientales por parte de las Secretaría Distrital de Ambiente

\$ 110.996.477.752 \$ 3.116.466.137

Tabla 2. Fuente OCIG

2. PARQUE LINEAL RIO TUNJUELO

NUM	CLASE DE CONTRATO	NUMERO DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE CONTRATISTA	PLAZO INICIAL	FECHA DE INICIO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL GIRADO CONTRATO	ESTADO DEL CONTRATO A OCT 03	OBSERVACION
1	CONSULTORIA	<u>1-02-25100-1027-2016</u>	ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO DEL CORREDOR AMBIENTAL TUNJUELO – CHIGUAZA Y DEL DISEÑO DETALLADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO DE 11 KM DEL CORREDOR AMBIENTAL QUE INCLUYA TODOS LOS DISEÑOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS NECESARIOS PARA SU CONSTRUCCIÓN Y SOSTENIBILIDAD.	CONSORCIO CORREDOR AMBIENTAL TUNJUELO-CHIGUAZA	12 MESES	1/03/2017	\$ 1.907.000.000	\$ 1.906.999.998	Liquidado	
2	INTERVENTORIA CONSULTORIA	<u>2-15-25100-1075-2016</u>	INTERVENTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO DEL CORREDOR AMBIENTAL TUNJUELO – CHIGUAZA Y DEL DISEÑO DETALLADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO DE 11 KM DEL CORREDOR AMBIENTAL QUE INCLUYA TODOS LOS DISEÑOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS NECESARIOS PARA SU CONSTRUCCIÓN Y SOSTENIBILIDAD.	MGP ARQUITECTURA Y URBANISMO SAS	13 MESES	1/03/2017	\$ 196.882.350	\$ 177.194.118	Terminado	
3	CONSULTORIA	<u>1-02-25100-1163-2017</u>	ELABORAR LOS DISENOS DETALLADOS TECNICOS Y ARQUITECTONICOS, URBANOS Y PAISAJISTICOS DEL CORREDOR AMBIENTAL TUNJUELO, TRAMO AV. GAITAN CORTES - RIO BOGOTÁ	CONSORCIO CORREDOR AMBIENTAL TUNJUELO-TRAMO 2	7 MESES	4/04/2018	\$ 2.120.000.000	\$ 880.005.098	Terminado	ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA 11001334306220220013300
4	INTERVENTORIA CONSULTORIA	<u>1-15-25100-1180-2017</u>	INTERVENTORIA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES ELABORAR LOS DISEÑOS DETALLADOS TECNICOS Y ARQUITECTONICOS,	CONSORCIO AGUAS BOGOTA	8 MESES	4/04/2018	\$ 344.425.278	\$ 211.518.041	Terminado	

2. PARQUE LINEAL RIO TUNJUELO

NUM	CLASE DE CONTRATO	NUMERO DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE CONTRATISTA	PLAZO INICIAL	FECHA DE INICIO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL GIRADO CONTRATO	ESTADO DEL CONTRATO A OCT 03	OBSERVACION
			URBANOS Y PAISAJISTICOS DEL CORREDOR AMBIENTAL TUNJUELO, TRAMO AV. GAITAN CORTES - RIO BOGOTÁ							
5	OBRA CIVIL	<u>1-01-25100-1428-2018</u>	CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL CORREDOR AMBIENTAL DEL RIO TUNJUELO – CHIGUAZA, GRUPO UNO (1), GRUPO DOS (2), GRUPO TRES (3) Y GRUPO (4) GRUPO (1) CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE PAISAJE DE LAS UNIDADES UNO (1) Y DOS (2) DEL CORREDOR AMBIENTAL DEL RIO TUNJUELO – CHIGUAZA.	CONSORCIO RIO TUNJUELO CHIGUAZA	10 MESES	9/04/2019	\$ 12.514.032.508	\$ 8.791.820.511	En Ejecución	AÚN NO PROCEDEN ACCIONES JUDICIALES TODA VEZ QUE la GCSM dio un alcance a la solicitud
6	OBRA CIVIL	<u>1-01-25100-1448-2018</u>	CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL CORREDOR AMBIENTAL DEL RÍO TUNJUELO – CHIGUAZA, GRUPO UNO (1), GRUPO DOS (2), GRUPO TRES (3) Y GRUPO CUATRO (4) GRUPO (2) CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE LA UNIDAD DE PAISAJE TRES (3) DEL CORREDOR AMBIENTAL DEL RÍO TUNJUELO – CHIGUAZA	CONSORCIO CORREDOR CHIGUAZA DPC	10 MESES	15/07/2019	\$ 17.012.601.225	\$ 12.600.119.304	Terminado	
7	OBRA CIVIL	<u>1-01-25100-1417-2018</u>	CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DEL CORREDOR AMBIENTAL DEL RIO TUNJUELO - CHIGUAZA, GRUPO UNO (1), GRUPO DOS (2), GRUPO TRES (3) Y GRUPO CUATRO (4) GRUPO TRES (3): CONSTRUCCION DE LAS	CONSORCIO RENOVACION TUNJUELO CHIGUAZA	10 MESES	6/05/2019	\$ 17.576.792.305	\$ 15.588.720.034	Terminado	

2. PARQUE LINEAL RIO TUNJUELO

NUM	CLASE DE CONTRATO	NUMERO DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE CONTRATISTA	PLAZO INICIAL	FECHA DE INICIO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL GIRADO CONTRATO	ESTADO DEL CONTRATO A OCT 03	OBSERVACION
			OBRAS DE LA UNIDAD DE PAISAJE CUATRO (4) DEL CORREDOR AMBIENTAL DEL RIO TUNJUELO - CHIGUAZA.							
8	OBRA CIVIL	<u>1-01-25100-1466-2018</u>	CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL CORREDOR AMBIENTAL DEL RÍO TENJUELO – CHIGUAZA, GRUPO UNO (1), GRUPO DOS (2), GRUPO TRES (3) Y GRUPO CUATRO (4); CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE LA UNIDAD DE PAISAJE CINCO (5) DEL CORREDOR AMBIENTAL DEL RÍO TUNJUELO – CHIGUAZA.	CONSORCIO CORREDORES C Y S	10 MESES	18/03/2019	\$ 15.187.079.515	\$ 13.414.260.481	Liquidado	
9	INTERVENTORIA OBRA	<u>1-15-25100-1460-2018</u>	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA, AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL CORREDOR AMBIENTAL DEL RIO TUNJUELO-CHIGUAZA, GRUPO UNO (1), GRUPO DOS (2), GRUPO TRES (3) Y GRUPO CUATRO (4).	CONSORCIO AGUAS ETSA-SIGA	11 MESES	18/03/2019	\$ 5.135.764.372	\$ 791.578.634	Terminado	
							\$ 71.994.577.553	\$ 54.362.216.219		

Tabla 3. Fuente OCIG

3. PARQUE LINEAL JABOQUE

NUM	CLASE DE CONTRATO	NUMERO DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE CONTRATISTA	PLAZO INICIAL	FECHA DE INICIO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL GIRADO CONTRATO	ESTADO DEL CONTRATO A OCT 03	OBSERVACION
1	CONSULTORIA	2-02-26600-1004-2016	ELABORACION DEL CONTROL GEODESICO TOPOGRAFIA ORTOFOTO Y PRODUCTOS CARTOGRAFICOS PARA LOS DISEÑOS DE LOS CORREDORES AMBIENTALES DEL RIO TUNJUELO RIO FUCHA HUMEDAL JABOQUE BORDE NORTE HUMEDAL JUAN AMARILLO Y PARQUE REGIONAL SAN RAFAEL	INGEOMATICA S.A.S.	2 MESES	10/01/2017	\$ 528.981.480	\$ 148.105.150	Liquidado	
2	CONSULTORIA	2-02-25100-0413-2017	ELABORAR EL DISEÑO DETALLADO DE LOS COMPONENTES ARQUITECTÓNICO, URBANO Y PASIJÍSTICO DEL TERCIO BAJO DEL HUMEDAL JABOQUE CON EN ENFOQUE PARTICIPATIVO	CONNATURAL SAS	9 MESES	24/04/2017	\$ 652.779.013	\$ 652.778.994	Liquidado	
3	INTERVENTORIA CONSULTORIA	2-15-25100-0392-2017	INTERVENTORIA PARA LOS CONTRATOS POR OBJETO ELABORAR EL DISEÑO DETALLADO DE LOS COMPONENTES ARQUITECTONICO, URBANO Y PAISAJISTICO DEL TERCIO BAJO DEL HUMEDAL JABOQUE CON ENFOQUE PARTICIPATIVO Y ELABORAR EL DISEÑO DETALLADO DE LOS COMPONENTES ARQUITECTONICO, URBANO Y PAISAJISTICO DEL BORDE NORTE DEL HUMEDAL JUAN AMARILLO CON ENFOQUE PARTICIPATIVO	CARLOS G. CAMPUZANO CASTELLO	10 MESES	24/04/2017	\$ 81.579.781	\$ -	Liquidado	Los valores girados de tuvieron en cuenta para el corredor Juan Amarillo

3. PARQUE LINEAL JABOQUE

NUM	CLASE DE CONTRATO	NUMERO DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE CONTRATISTA	PLAZO INICIAL	FECHA DE INICIO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL GIRADO CONTRATO	ESTADO DEL CONTRATO A OCT 03	OBSERVACION
4	CONSULTORIA	2-02-25100-0732-2017	ELABORAR LOS LINEAMIENTOS PARA LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA, FORMULAR EL MANEJO DEL COMPONENTE BIÓTICO Y DESARROLLAR LA GESTIÓN SOCIAL PARA EL PROYECTO CORREDOR AMBIENTAL HUMEDAL JABOQUE Y CORREDOR AMBIENTAL BORDE NORTE HUMEDAL JUAN AMARILLO	ECODES INGENIERIA S.A.S	6 MESES	25/08/2017	\$ 547.031.956	\$ 273.515.978	Liquidado	
5	CONSULTORIA	1-02-25100-0702-2017	ELABORACION DE LOS DISEÑOS DE LOS SISTEMAS TECNICOS DETALLADOS EN CONCORDANCIA CON LOS DISEÑOS ARQUITECTONICOS, URBANOS Y PAISAJISTICOS PARA LA CONSTRUCCION DEL CORREDOR AMBIENTAL HUMEDAL JABOQUE Y CORREDOR AMBIENTAL HUMEDAL JUAN AMARILLO	INPROTEKTO LTDA	6 MESES	1/09/2017	\$ 1.769.159.802	\$ 894.313.775	Liquidado	ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA 25000233600020210007900
6	INTERVENTORIA CONSULTORIA	2-15-25100-0706-2017	INTERVENTORÍA PARA EL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO ELABORACION DE LOS DISEÑOS DE LOS SISTEMAS TECNICOS DETALLADOS EN CONCORDANCIA CON LOS DISEÑOS ARQUITECTONICOS, URBANOS Y PAISAJISTICOS PARA LA CONSTRUCCION DEL CORREDOR AMBIENTAL HUMEDAL	ELSA TORRES ARENALES	7 MESES	25/08/2017	\$ 336.758.802	\$ 172.983.059	Liquidado	

3. PARQUE LINEAL JABOQUE

NUM	CLASE DE CONTRATO	NUMERO DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE CONTRATISTA	PLAZO INICIAL	FECHA DE INICIO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL GIRADO CONTRATO	ESTADO DEL CONTRATO A OCT 03	OBSERVACION
			JABOQUE Y CORREDOR AMBIENTAL HUMEDAL JUAN AMARILLO							
7	OBRA CIVIL	1-01-25100-1455-2018	CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR AMBIENTAL DEL HUMEDAL JABOQUE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., GRUPO UNO (1) Y GRUPO DOS (2), GRUPO UNO (1): CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR AMBIENTAL BORDE SUR DEL HUMEDAL JABOQUE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D. C.	CONSORCIO ESPERANZA JABOQUE	10 MESES	6/05/2019	\$ 15.092.659.498	\$ 4.688.231.234	Terminado	Con asignación de apoderado y proyecto de demanda elaborada, se solicitó a Corredores informe sobre la tasación de perjuicios.
8	OBRA CIVIL	1-01-25100-1408-2018	CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR AMBIENTAL DEL HUMEDAL JABOQUE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D. C., GRUPO UNO (1) Y GRUPO DOS (2) GRUPO DOS (2): CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR AMBIENTAL BORDE NORTE DEL HUMEDAL JABOQUE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D. C.	CONSORCIO CAPITAL 1262	10 MESES	22/04/2019	\$ 11.514.741.453	\$ 7.971.768.934	Terminado	
9	INTERVENTORIA OBRA	1-15-25100-1420-2018	REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y CONTABLE AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR AMBIENTAL	MAB INGENIERIA DE VALOR	11 MESES	22/04/2019	\$ 2.333.504.457	\$ 130.000.000	En Ejecución	

3. PARQUE LINEAL JABOQUE

NUM	CLASE DE CONTRATO	NUMERO DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE CONTRATISTA	PLAZO INICIAL	FECHA DE INICIO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL GIRADO CONTRATO	ESTADO DEL CONTRATO A OCT 03	OBSERVACION
			HUMEDAL JABOQUE EN LOS BORDES NORTE Y SUR DE LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.							
10	OBRA CIVIL	1-01-25100-1220-2022	REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS QUE DIERON ORIGEN LA CONSTRUCCIÓN, ASÍ COMO EL DIAGNÓSTICO DE LA OBRA Y LA CULMINACIÓN DE LA OBRA, PROYECTO: CORREDOR AMBIENTAL HUMEDAL JABOQUE, INCLUYENDO LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DEL ÁREA AFECTADA	CONSORCIO JABOQUE GPS 2022	8 MESES	N/R	\$ 14.455.920.444	\$ -	Suscrito Legalizado	
11	INTERVENTORIA OBRA	1-15-25100-1247-2022	INTERVENTORIA INTEGRAL PARA: LA REVISION, ACTUALIZACION, AJUSTES Y COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS QUE DIERON ORIGEN LA CONSTRUCCION, ASI COMO EL DIAGNOSTICO DE LA OBRA Y LA CULMINACION DE LA OBRA, PROYECTO: CORREDOR AMBIENTAL HUMEDAL JABOQUE, INCLUYENDO LA RESTAURACION ECOLOGICA DEL AREA AFECTADA.	CONSORCIO RENOVACION JA	8 MESES	N/R	\$ 1.037.316.078	\$ -	Suscrito Legalizado	
							\$ 48.350.432.764	\$ 14.931.697.124		

Tabla 4. Fuente OCIG

4. PARQUE LINEAL JUAN AMARILLO

NUM	CLASE DE CONTRATO	NUMERO DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE CONTRATISTA	PLAZO INICIAL	FECHA DE INICIO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL GIRADO CONTRATO	ESTADO DEL CONTRATO A OCT 03	OBSERVACION
1	CONSULTORIA	2-02-25100-0395-2017	ELABORACION DE LOS DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS DETALLADOS EN EL LIMITE LEGAL DEL HUMEDAL JUAN AMARILLO PARA LA CONEXION ENTRE LA ALAMEDA DEL BORDE SUR - ORIENTAL DEL HUMEDAL CON EL SECTOR DE SANTA CECILIA LISBOA	GREELEY AND HANSEN COLOMBIA SAS	5 MESES	31/03/2017	\$ 736.992.612	\$ 668.856.371	Liquidado	
2	INTERVENTORIA CONSULTORIA	2-15-25100-0408-2017	INTERVENTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS DETALLADOS EN EL LÍMITE LEGAL DEL HUMEDAL JUAN AMARILLO PARA LA CONEXIÓN ENTRE LA ALAMEDA DEL BORDE SUR-ORIENTAL DEL HUMEDAL CON EL SECTOR DE SANTA CECILIA LISBOA.	GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADERE	6 MESES	31/03/2017	\$ 89.334.183	\$ 69.974.556	Liquidado	
3	CONSULTORIA	2-02-25100-0373-2017	ELABORAR EL DISEÑO DETALLADO DE LOS COMPONENTES ARQUITECTONICO URBANO Y PAISAJISTICO DEL BORDE NORTE DEL HUMEDAL JUAN AMARILLO CON ENFOQUE PARTICIPATIVO	G X SAMPER ARQUITECTOS LTDA	9 MESES	24/04/2017	\$ 652.779.013	\$ 652.778.997	Liquidado	
4	INTERVENTORIA CONSULTORIA	2-15-25100-0392-2017	INTERVENTORIA PARA LOS CONTRATOS POR OBJETO ELABORAR EL DISEÑO DETALLADO DE LOS COMPONENTES ARQUITECTONICO, URBANO Y PAISAJISTICO DEL TERCIO BAJO DEL HUMEDAL JABOQUE CON ENFOQUE PARTICIPATIVO Y ELABORAR EL DISEÑO DETALLADO DE LOS	CARLOS G. CAMPUZANO CASTELLO	10 MESES	24/04/2017	\$ 93.455.853	\$ 93.455.853	Liquidado	

4. PARQUE LINEAL JUAN AMARILLO

NUM	CLASE DE CONTRATO	NUMERO DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE CONTRATISTA	PLAZO INICIAL	FECHA DE INICIO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL GIRADO CONTRATO	ESTADO DEL CONTRATO A OCT 03	OBSERVACION
			COMPONENTES ARQUITECTONICO, URBANO Y PAISAJISTICO DEL BORDE NORTE DEL HUMEDAL JUAN AMARILLO CON ENFOQUE PARTICIPATIVO							
5	OBRA CIVIL	1-01-25100-0648-2018	CONSTRUCCION DE LA CONEXION FUNCIONAL ENTRE LA ALAMEDA DEL BORDE SUR ORIENTAL CIUADDELA COLSUBSIDIO EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVA Y EL SECTOR DE SANTA CECILIA - LISBOA DE LA LOCALIDAD DE SUBA, EN EL LIMITE LEGAL DEL HUMEDAL JUAN AMARILLO - FASE I	CONSORCIO OBRAS JUAN AMARILLO	14 MESES	1/10/2018	\$ 20.055.705.447	\$ 13.402.801.838	Suspendido	ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA 25000233600020220032 300
6	INTERVENTORIA OBRA	1-15-25100-0881-2018	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA, AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA CONEXIÓN FUNCIONAL ENTRE LA ALAMEDA DEL BORDE SUR - ORIENTAL (CIUADDELA COLSUBSIDIO EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVA) Y EL SECTOR DE SANTA CECILIA - LISBOA DE LA LOCALIDAD DE SUBA EN EL LIMITE LEGAL DEL HUMEDAL JUAN AMARILLO - FASE 1	CONSORCIO TPF	15 MESES	1/10/2018	\$ 2.170.296.966	\$ 1.356.452.000	En Ejecución	

4. PARQUE LINEAL JUAN AMARILLO

NUM	CLASE DE CONTRATO	NUMERO DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE CONTRATISTA	PLAZO INICIAL	FECHA DE INICIO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL GIRADO CONTRATO	ESTADO DEL CONTRATO A OCT 03	OBSERVACION
7	OBRA CIVIL	1-01-25100-1461-2018	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL EN EL HUMEDAL JUAN AMARILLO BORDE NORTE, GRUPO UNO (1) Y GRUPO DOS (2) GRUPO 1: CONSTRUCCION DEL CORREDOR AMBIENTAL BORDE NORTE DEL TERCIO ALTO DEL HUMEDAL JUAN AMARILLO EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.	CONSORCIO AYAL JUAN AMARILLO	10 MESES	1/03/2019	\$ 20.975.821.818	\$ 15.316.823.820	Suspendido	
8	OBRA CIVIL	1-01-25100-1458-2018	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL EN EL HUMEDAL JUAN AMARILLO BORDE NORTE, GRUPO UNO (1) Y GRUPO DOS (2) GRUPO 2 CONSTRUCCION DEL CORREDOR AMBIENTAL BORDE NORTE DE LOS TERCIOS BAJO Y MEDIO DEL HUMEDAL JUAN AMARILLO EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.	CONSORCIO CAPITAL 1268	10 MESES	1/03/2019	\$ 20.916.176.256	\$ 18.619.208.528	En Ejecución	
9	INTERVENTORIA OBRA	1-15-25100-1464-2018	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y CONTABLE AL PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR AMBIENTAL HUMEDAL JUAN AMARILLO BORDE NORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.	CONSORCIO INTERVENTORIA JUAN AMARILLO	11 MESES	1/03/2019	\$ 2.697.686.738	\$ 951.496.661	Suspendido	

4. PARQUE LINEAL JUAN AMARILLO

NUM	CLASE DE CONTRATO	NUMERO DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE CONTRATISTA	PLAZO INICIAL	FECHA DE INICIO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL GIRADO CONTRATO	ESTADO DEL CONTRATO A OCT 03	OBSERVACION
10	OBRA CIVIL	1-01-25100-1203-2022	REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS QUE DIERON ORIGEN LA CONSTRUCCIÓN, ASÍ COMO EL DIAGNÓSTICO DE LA OBRA Y LA CULMINACIÓN DE LA OBRA, DEL PROYECTO: CONEXIÓN ENTRE LA ALAMEDA DEL BORDE SUR -ORIENTAL DEL HUMEDAL CON EL SECTOR SANTA CECILIA DEL HUMEDAL JUAN AMARILLO, INCLUYENDO LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DEL ÁREA AFECTADA	CONSORCIO RESTAURACION JUAN AMARILLO	8 MESES	N/R	\$ 11.887.106.303	\$ -	Suscrito Legalizado	
11	INTERVENTORIA OBRA	1-15-25100-1208-2022	INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS QUE DIERON ORIGEN LA CONSTRUCCIÓN, ASÍ COMO EL DIAGNOSTICO DE LA OBRA Y LA CULMINACIÓN DE LA OBRA, DEL PROYECTO: CONEXIÓN ENTRE LA ALAMEDA DEL BORDE SUR -ORIENTAL DEL HUMEDAL CON EL SECTOR SANTA CECILIA DEL HUMEDAL JUAN AMARILLO, INCLUYENDO LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DEL ÁREA AFECTADA.	COZADEL S.A.S	8 MESES	N/R	\$ 1.146.375.395	\$ -	Suscrito Legalizado	

\$ 81.421.730.584 \$ 51.131.848.624

Tabla 5. Fuente OCIG

5. PARQUE LINEAL CORDOBA

NUM	CLASE DE CONTRATO	NUMERO DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE CONTRATISTA	PLAZO INICIAL	FECHA DE INICIO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL GIRADO CONTRATO	ESTADO DEL CONTRATO A OCT 03	OBSERVACION
1	CONSULTORIA	1-02-25100-1178-2017	ELABORACION Y AJUSTE DE LOS DISEÑOS DETALLADOS DEL CORREDOR AMBIENTAL HUMEDAL CORDOBA	SANTANDER BELEÑO PEREZ	8 MESES	2/03/2018	\$ 599.003.963	\$ 165.437.308	Liquidado	
2	INTERVENTORIA CONSULTORIA	2-15-25100-1241-2017	INTERVENTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS DETALLADOS ARQUITECTONICOS, URBANOS, PAISAJISTICOS Y TÉCNICOS DEL CORREDOR AMBIENTAL RIO ARZOBISPO E INTERVENTORIA PARA LA ELABORACION Y AJUSTE DE LOS DISEÑOS DETALLADOS DEL CORREDOR AMBIENTAL HUMEDAL CORDOBA	CONSORCIO AGUAS BOGOTA	9 MESES	2/03/2018	\$ -	\$ -	Liquidado	Los valores comprometidos y girados de tuvieron en cuenta para el parque lineal arzobispo
3	OBRA CIVIL	1-01-25100-1435-2019	CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR AMBIENTAL DEL HUMEDAL CORDOBA, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., GRUPO 1 Y GRUPO 2 GRUPO UNO (1) CONSTRUCCION DE CORREDOR AMBIENTAL SECTOR 2 Y AULA AMBIENTAL DEL HUMEDAL CORDOBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.	CONSORCIO HUMEDAL CORDOBA 1308	6 MESES	8/06/2020	\$ 7.863.465.686	\$ 6.403.340.101	En Ejecución	
4	OBRA CIVIL	1-01-25100-1436-2019	CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR AMBIENTAL DEL HUMEDAL CORDOBA, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., GRUPO 1 Y GRUPO 2 GRUPO DOS (2): CONSTRUCCION DE CORREDOR AMBIENTAL SECTOR 1 Y SECTOR 3 DEL HUMEDAL CORDOBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.	CONSORCIO OBRAS AMBIENTALES BOGOTA	6 MESES	26/05/2020	\$ 7.173.083.696	\$ 2.193.005.710	En Ejecución	QUERRELLA POLICIVA ALCALDÍA LOCAL DE SUBA En asignación de radicado por la Inspección

5. PARQUE LINEAL CORDOBA										
NUM	CLASE DE CONTRATO	NUMERO DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE CONTRATISTA	PLAZO INICIAL	FECHA DE INICIO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL GIRADO CONTRATO	ESTADO DEL CONTRATO A OCT 03	OBSERVACION
5	INTERVENTORIA OBRA	1-15-25100-1431-2019	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA, AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR AMBIENTAL DEL HUMEDAL CÓRDOBA, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., GRUPO 1: SECTOR 2 Y AULA AMBIENTAL Y GRUPO 2: SECTOR 1 Y 3.	CONSORCIO ECOLÓGICO 40.4	7 MESES	14/05/2020	\$ 2.018.110.167	\$ 486.110.148	En Ejecución	
							\$ 17.653.663.512	\$ 9.247.893.267		

Tabla 6. Fuente OCIG

6. PARQUE LINEAL ARZOBISPO										
NUM	CLASE DE CONTRATO	NUMERO DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE CONTRATISTA	PLAZO INICIAL	FECHA DE INICIO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL GIRADO CONTRATO	ESTADO DEL CONTRATO A OCT 03	OBSERVACION
1	CONSULTORIA	1-02-25100-1272-2017	ELABORAR LOS DISEÑOS DETALLADOS ARQUITECTONICOS, URBANOS, PAISAJISTICOS Y TÉCNICOS DEL CORREDOR AMBIENTAL RÍO ARZOBISPO	CONSORCIO DARP BOGOTA 2017	7 MESES	8/03/2018	\$ 1.432.272.114	\$ 649.935.819	Liquidado	
2	INTERVENTORIA CONSULTORIA	2-15-25100-1241-2017	INTERVENTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS DETALLADOS ARQUITECTONICOS, URBANOS, PAISAJISTICOS Y TÉCNICOS DEL CORREDOR AMBIENTAL RIO ARZOBISPO E INTERVENTORIA PARA LA ELABORACION Y AJUSTE DE LOS DISEÑOS DETALLADOS	CONSORCIO AGUAS BOGOTA	9 MESES	2/03/2018	\$ 325.007.241	\$ 41.836.400	Liquidado	

6. PARQUE LINEAL ARZOBISPO										
NUM	CLASE DE CONTRATO	NUMERO DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE CONTRATISTA	PLAZO INICIAL	FECHA DE INICIO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL GIRADO CONTRATO	ESTADO DEL CONTRATO A OCT 03	OBSERVACION
			DEL CORREDOR AMBIENTAL HUMEDAL CORDOBA							
3	OBRA CIVIL	1-01-25100-1309-2019	CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR AMBIENTAL RÍO ARZOBISPO, CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, ÁMBITOS 1, 2 Y 3	CONSORCIO ARZOBISPO	8 MESES	16/06/2020	\$ 5.123.581.520	\$ 3.718.427.559	En Ejecución	
4	INTERVENTORIA OBRA	1-15-25100-1366-2019	INTERVENTORÍA TÉCNICA. ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR AMBIENTAL RÍO ARZOBISPO, CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., ÁMBITOS 1, 2 Y 3.	CONSORCIO AMBIENTAL	9 MESES	16/06/2020	\$ 800.360.796	\$ 578.233.701	En Ejecución	
							\$ 7.681.221.671	\$ 4.988.433.479		

Tabla 7. Fuente OCIG

7. SENDERO DE LAS MARIPOSAS										
NUM	CLASE DE CONTRATO	NUMERO DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE CONTRATISTA	PLAZO INICIAL	FECHA DE INICIO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL GIRADO CONTRATO	ESTADO DEL CONTRATO A OCT 03	OBSERVACION
1	CONSULTORIA	2-02-25100-0331-2017	CONSULTORIA PARA LA GESTION DEL PROYECTO SENDERO LAS MARIPOSAS EN SU ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	MONTENEGRO LIZARRALDE Y CIA LTDA ARQUITECTOS	6 MESES	18/04/2017	\$ 723.504.540	\$ 723.504.540	Terminado	La fase de construcción del objeto del contrato fue suspendido y liquidado debido a una decisión unilateral de la SDA relacionada

7. SENDERO DE LAS MARIPOSAS

NUM	CLASE DE CONTRATO	NUMERO DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE CONTRATISTA	PLAZO INICIAL	FECHA DE INICIO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL GIRADO CONTRATO	ESTADO DEL CONTRATO A OCT 03	OBSERVACION
										con el desistimiento del trámite de Licencia Ambiental ante la ANLA.
2	CONSULTORIA	2-02-25100-0604-2017	DESARROLLO DISEÑO ARQUITECTONICO CONCEPTUAL DEL PROYECTO Y DE LOS DISEÑOS ARQUITECTONICOS NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO SENDERO LAS MARIPOSAS	TALLER 301 S.A.S	5 MESES	20/06/2017	\$ 930.147.756	\$ 627.516.997	Liquidado	La fase de construcción del objeto del contrato fue suspendido y liquidado debido a una decisión unilateral de la SDA relacionada con el desistimiento del trámite de Licencia Ambiental ante la ANLA.
3	CONSULTORIA	1-02-25100-1154-2017	ELABORAR EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, LOS DISEÑOS TÉCNICOS DETALLADOS Y LA FACTIBILIDAD DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS Y DE LAS ESTRUCTURAS ESPECIALES DEL PROYECTO SENDERO DE LAS MARIPOSAS	CONSORCIO SENDERO LAS MARIPOSAS 2017	12 MESES	22/01/2018	\$ 7.562.452.075	\$ 2.397.202.283	Liquidado	La fase de construcción del objeto del contrato fue suspendido y liquidado debido a una decisión unilateral de la SDA relacionada con el desistimiento del trámite de Licencia Ambiental ante la ANLA.
4	INTERVENTORIA CONSULTORIA	1-15-25100-1213-2017	INTERVENTORIA PARA ELABORAR EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, LOS DISEÑOS TECNICOS DETALLADOS, LA FACTIBILIDAD DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS Y DE LAS ESTRUCTURAS ESPECIALES DEL PROYECTO SENDERO DE LAS MARIPOSAS	CONSORCIO COBA-HIDROCONSULTA	13 MESES	22/01/2018	\$ 1.772.593.079	\$ 818.529.250	Liquidado	La fase de construcción del objeto del contrato fue suspendido y liquidado debido a una decisión unilateral de la SDA relacionada con el desistimiento del

7. SENDERO DE LAS MARIPOSAS										
NUM	CLASE DE CONTRATO	NUMERO DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE CONTRATISTA	PLAZO INICIAL	FECHA DE INICIO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL GIRADO CONTRATO	ESTADO DEL CONTRATO A OCT 03	OBSERVACION
										tramite de Licencia Ambiental ante la ANLA.
5	CONSULTORIA	2-02-25100-1316-2017	DESARROLLO DE LOS DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO SENDERO DE LAS MARIPOSAS	TALLER 301 S.A.S	8 MESES	22/01/2018	\$ 892.205.578	\$ 727.385.474	Liquidado	La fase de construcción del objeto del contrato fue suspendido y liquidado debido a una decisión unilateral de la SDA relacionada con el desistimiento del trámite de Licencia Ambiental ante la ANLA.
6	INTERVENTORIA CONSULTORIA	2-15-25100-1318-2017	INTERVENTORÍA PARA EL DESARROLLO DE LOS DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO SENDERO DE LAS MARIPOSAS	MAB INGENIERIA DE VALOR	9 MESES	22/01/2018	\$ 235.642.534	\$ 197.920.800	Liquidado	La fase de construcción del objeto del contrato fue suspendido y liquidado debido a una decisión unilateral de la SDA relacionada con el desistimiento del trámite de Licencia Ambiental ante la ANLA.
							\$ 12.116.545.562	\$ 5.492.059.344		

Tabla 8. Fuente OCIG

8. PARQUE REGIONAL SAN RAFAEL

NUM	CLASE DE CONTRATO	NUMERO DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE CONTRATISTA	PLAZO INICIAL	FECHA DE INICIO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL GIRADO CONTRATO	ESTADO DEL CONTRATO A OCT 03	OBSERVACION
1	CONSULTORIA	2-02-25100-0487-2016	CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL MODELO DE OPERACIÓN PARA EL USO PUBLICO DEL PROYECTO " APERTURA TEMPRANA- FASE I, PARQUE REGIONAL SAN RAFAEL DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	INGETEC S.A.S	4 MESES	4/10/2016	\$ 215.782.219	\$ 215.782.218	Liquidado	A la fecha no se tiene información con relación a si la EAAB adelantará la fase de construcción de las obras objeto de las consultorías
2	CONSULTORIA	2-02-25100-0542-2016	CONSULTORÍA PARA LA GESTIÓN DEL PROYECTO PARQUE SAN RAFAEL	MONTENEGRO LIZARRALDE Y CIA LTDA ARQUITECTOS	6 MESES	18/10/2016	\$ 674.540.000	\$ 674.540.000	Liquidado	A la fecha no se tiene información con relación a si la EAAB adelantará la fase de construcción de las obras objeto de las consultorías
3	CONSULTORIA	2-02-25100-0808-2016	CONSULTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA VISIÓN Y ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL PARQUE SAN RAFAEL.	TALLER 301 S.A.S	3 MESES	7/12/2016	\$ 209.351.817	\$ 209.351.816	Terminado	A la fecha no se tiene información con relación a si la EAAB adelantará la fase de construcción de las obras objeto de las consultorías
4	CONSULTORIA	2-02-25100-0823-2016	CONSULTORÍA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS DEL PROYECTO PARQUE SAN RAFAEL.	DURAN & OSORIO ABOGADOS ASOCIADOS	2 MESES	16/12/2016	\$ 115.976.336	\$ 115.976.336	Liquidado	A la fecha no se tiene información con relación a si la EAAB adelantará la fase de construcción de las obras objeto de las consultorías
5	OBRA CIVIL	2-01-25100-0869-2016	ADECUACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL USO PÚBLICO DEL PROYECTO "APERTURA TEMPRANA-FASE I, PARQUE REGIONAL SAN RAFAEL.	ALEJANDRO CASTAÑO ARQUITECTO EU	3 MESES	16/01/2017	\$ 685.317.897	\$ 685.289.014	Liquidado	A la fecha no se tiene información con relación a si la EAAB adelantará la fase de construcción de las obras objeto de las consultorías

6	CONSULTORIA	2-02-25100-0599-2017	SEGUIMIENTO, CONTROL Y COORDINACION EN LA IMPLEMENTACION DE LA FASE DE DISEÑOS DETALLADOS PARA EL PROYECTO DEL PARQUE REGIONAL DEL ROCIO (SAN RAFAEL)	MONTENEGRO LIZARRALDE Y CIA LTDA ARQUITECTOS	8 MESES	29/06/2017	\$ 723.774.565	\$ 723.774.565	Terminado	A la fecha no se tiene información con relación a si la EAAB adelantará la fase de construcción de las obras objeto de las consultorías
7	CONVENIO	9-07-25100-0883-2017	AUNAR ESFUERZOS PARA LLEVAR A CABO LA ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA, LEGAL Y FINANCIERA DE LA OBRA Y LA OPERACIÓN DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: (I) PARQUE ECOLOGICO SAN RAFAEL Y II EL CABLE AEREO SAN RAFAEL QUE CONECTE A BOGOTA D.C. CON EL PARQUE ECOLOGICO SAN RAFAEL EN LA CALERA	F.D.N	13 MESES	18/10/2017	\$ 14.952.102.001	\$ 14.317.570.138	Liquidado	A la fecha no se tiene información con relación a si la EAAB adelantará la fase de construcción de las obras objeto de las consultorías

\$ 17.576.844.835 \$ 16.942.284.087

Tabla 9. Fuente OCIG

9. PARQUE DEL INDIO										
NUM	CLASE DE CONTRATO	NUMERO DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE CONTRATISTA	PLAZO INICIAL	FECHA DE INICIO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL GIRADO CONTRATO	ESTADO DEL CONTRATO A OCT 03	OBSERVACION
1	CONSULTORIA	2-02-25100-0393-2017	ACTUALIZACION Y AJUSTE DE DISEÑOS ARQUITECTONICOS, URBANOS Y PAISAJISTICOS DEL PARQUE EL INDIO.	OPUS OFICINA DE PROYECTOS URBANOS SAS	7 MESES	10/04/2017	\$ 617.860.094	\$ 617.860.093	Liquidado	
2	CONSULTORIA	2-02-25100-0521-2017	ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS TÉCNICOS DETALLADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DEL INDIO, EN CONCORDANCIA CON LOS DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, URBANÍSTICOS Y PAISAJÍSTICOS.	CEYCO SAS	7 MESES	16/06/2017	\$ 709.927.242	\$ 709.927.242	Liquidado	

9. PARQUE DEL INDIO										
NUM	CLASE DE CONTRATO	NUMERO DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE CONTRATISTA	PLAZO INICIAL	FECHA DE INICIO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL GIRADO CONTRATO	ESTADO DEL CONTRATO A OCT 03	OBSERVACION
3	INTERVENTORIA CONSULTORIA	2-15-25100-0547-2017	INTERVENTORIA PARA LOS CONTRATOS QUE TIENEN POR OBJETO LA ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS TÉCNICOS DETALLADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DEL INDIO, EN CONCORDANCIA CON LOS DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, URBANÍSTICOS Y PAISAJÍSTICOS Y ACTUALIZACION Y AJUSTES DE LOS DISEÑOS ARQUITECTONICOS, URBANISTICOS Y PAISAJISTICOS DEL PARQUE DEL INDIO.	INGETEC S.A.S	8 MESES	25/05/2017	\$ 245.480.658	\$ 245.480.657	Liquidado	
4	CONSULTORIA	2-02-25100-0597-2017	ELABORACION DEL DISEÑO DETALLADO DEL MANEJO SILVICULTURAL Y BIOTICO PARA EL PROYECTO PARQUE EL INDIO	GEOAMBIENTE S.A.S	7 MESES	15/06/2017	\$ 199.122.700	\$ 199.122.001	Liquidado	
5	CONSULTORIA	2-02-25100-1240-2018	CONSULTORIA PARA REALIZAR EL PROGRAMA DE ARQUEOLOGÍA PREVENTIVA Y LOS TRÁMITES NECESARIOS HASTA LA APROBACIÓN DEL MISMO ANTE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA - ICANH, PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DEL PARQUE METROPOLITANO TANQUE DEL INDIO	SERVICIOS AMBIENTALES Y GEOGRAFICOS S.A.	4 MESES	4/12/2018	\$ 115.638.250	\$ 115.638.250	Liquidado	
							\$ 1.888.028.944	\$ 1.888.028.243		

Tabla 10. Fuente OCIG

De acuerdo con lo descrito en cada uno de las tablas 2 a la 10 realizadas, se observa que algunos de los contratos que se suscribieron para cumplir con el macroproyecto 0081 Corredores Ambientales cuentan con retrasos en sus obras, afectando así el indicador propuesto en el Plan General Estratégico 2020 – 2024 y el Plan Distrital de Desarrollo 2020 – 2024 cuya meta sectorial 205 corresponde a completar 3 corredores ambientales en áreas aferentes a corredores ecológicos de ronda o parques ecológicos distritales de humedal con una visión concentrada en la ecosostenibilidad respetando los espacios del agua y su biodiversidad asociada.

Efectuadas las anteriores precisiones el equipo auditor considero pertinente revisar el reporte de Seguimiento al Plan de desarrollo – SEGPLAN Inversión y Gestión con corte al 30 de septiembre de 2022; identificando dilación en el cumplimiento de los indicadores propuestos en los años 2020 y 2021 tal y como se muestra en la siguiente imagen:

205 Completar 3 corredores ambientales en áreas aferentes a corredores ecológicos de ronda o parques ecológicos distritales de humedal con una visión concentrada en la ecosostenibilidad respetando los espacios del agua y su biodiversidad asociada	\$17,894	\$840	4.69	\$9,263	\$9,016	97.33	\$208,207	\$205,793	98.84	\$1,000
Indicadores										
(S) 220 Número de corredores ambientales construidos										
	Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance					
					De la Vigencia	Transcurrido PD				
	2020	0.00	0.00	0.00	0.00%					
	2021	1.00	1.00	0.69	69.00%					
	2022	1.00	1.31	0.64	48.85%	▲	66.50%	▲		
	2023	1.00	1.00	0.00	0.00%					
	2024	0.00	0.00	0.00	0.00%					
	TOTAL	3.00	3.00	1.33	al Plan de Desarrollo		44.33%	▲		
Retrasos y soluciones:	<p>Parque Lineal Arzobispo El contrato finalizó el 29 de septiembre del 2022, no se ha facturado el total restante referente al 17,56%.</p> <p>Corredor Ambiental Córdoba Grupo 1 (Sector 2) El proyecto se encuentra en una etapa de finalización para entrega, senderos finalizados en un 100%. Aula ambiental en un 96%. El grupo 2 (El sector 1 y 3) se encuentra en presunto incumplimiento desde el 23 de diciembre del 2021.</p>									
Avances y Logros:	<p>Se presenta el avance del Parque Lineal Arzobispo 82,44% Ciclorutas: 1.49 km (meta 1.5km) Senderos: 2.7 km. (meta 2.5km) Estancias: 100% (meta 100%) Nota. El avance incluye ponderación de obras de urbanismo complementarias a cada uno de los 3 indicadores (instalaciones eléctricas y sanitarias, paisajismo, mobiliario urbano).</p> <p>Corredor Ambiental Humedal de Córdoba 50,59% Realizar la construcción de 3,2 km del sendero elevado Córdoba. Se adelanta la construcción de los senderos, con la elección de</p>									

Proyecto(s) de inversión											
81 - Construcción de Corredores Ambientales en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá											
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)											
(S)3 Terminar 3 unidad intervenciones en Corredores Ambientales	Magnitud	0.01	0.00	0.00	1.00	0.69	69.00	1.31	0.64	48.85	1.00
	Recursos	\$17,894	\$840	4.69	\$9,263	\$9,016	97.33	\$208,207	\$205,793	98.84	\$1,000

METAS PLAN DISTRIAL DE DESARROLLO Y MACROPROYECTOS ASOCIADOS 2020-2024 #SOMOS agua

Propósito - 2
Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática

Logro de ciudad - 14
Implementar estrategias de mantenimiento, recuperación, rehabilitación o restauración de la Estructura Ecológica Principal y demás áreas de interés ambiental en la ciudad-región

Programa estratégico - 6
Restauración, preservación y mantenimiento del ambiente natural

Programa - 28
Bogotá protectora de sus recursos naturales

Meta sectorial - 205
Completar 3 corredores ambientales en áreas aferentes a corredores ecológicos de ronda o parques ecológicos distritales de humedal con una visión concentrada en la ecosostenibilidad respetando los espacios del agua y su biodiversidad asociada.

Indicador
Construcción de corredores ambientales

Recursos Mill \$
185.6660



Meta EAB
3 Corredores

Macroproyecto: Construcción de Corredores Ambientales en el área de cobertura de la EAB.

MPFD0801F07-04





Valga la pena señalar, se denota una falta de articulación de las metas establecidas en el Plan de Distrital de Desarrollo 2020 -2024, pues obsérvese que en la meta sectorial se indica tres (3) corredores ambientales y a continuación en la meta proyecto de inversión cita “Terminar 3 unidad intervenciones en Corredores Ambientales”.

Adicionalmente, se consideró importante revisar el Plan General Estratégico 2020 – 2024 del cual se extrae que se realizara la construcción de corredores ambientales, lo anterior, difiere de lo citado en la meta proyecto de inversión puesto que se señala “Terminar 3 unidad intervenciones en Corredores Ambientales”, tal y como se muestra a continuación:

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2. TERRITORIO SENSIBLE AL AGUA

#SOMOS agua

Estrategia	Indicador Estratégico	Indicadores estratégicos									Articulación		
		Unidad	LB Dic 2019	Meta	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	PDD	IUS	MT	
2.1 Adaptación y mitigación al cambio climático	✓ 2.1.1	Conservación de hectáreas en cuencas abastecedoras y otras áreas de importancia estratégica	Has	168	6.000	700	1.500	2.500	4.500	6.000	X		
	2.1.2	Intervención integral de hectáreas en la estructura ecológica principal	Has	40,84	70,5	0	2,5	32	64	70,5	X		
	2.1.3	Número de diagnósticos para la recuperación del caudal ecológico de humedales	Un	NA	10	0	1	5	10	10	X		
	2.1.4	Individuos arbóreos sembrados	Un	NA	47.000	0	23.500	47.000	47.000	47.000	X		
	✓ 2.1.5	Avance en la construcción del campamento Piedras Gordas	%	NA	100	20	100	100	100	100	X		
	✓ 2.1.6	Construcción de corredores ambientales	Un	2,75	3	0	1	2	3	3	X		
	✓ 2.1.7	Reducción de la Huella de Carbono	tCO2e	25,395	2,040	400	800	1.200	1.600	2,040			

MPFD0801F07-04

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ | BOGOTÁ | Indicador aprobado JD 2604 (13-08-2020)

PROGRAMAS DE INVERSIÓN: MACROPROYECTOS


#SOMOS agua

COD	NOMBRE
19	Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado pluvial
20	Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado sanitario
21	Construcción del sistema troncal y secundario de alcantarillado sanitario
22	Construcción del sistema troncal y secundario de alcantarillado pluvial
50	Renovación y/o reposición de los sistemas de abastecimiento, distribución matriz y red local de acueducto
51	Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado sanitario
52	Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado pluvial
53	Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado combinado
54	Desarrollo de acciones para el saneamiento del Río Bogotá
55	Desarrollo de acciones para el fortalecimiento administrativo y operativo empresarial
68	Adecuación de las redes asociadas a la infraestructura vial
81	Construcción de Corredores Ambientales
82	Desarrollo del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos
7334	Construcción y expansión del sistema de abastecimiento y matriz de acueducto
7338	Construcción de redes locales para el servicio de acueducto
7341	Adecuación hidráulica y recuperación ambiental de humedales, quebradas, ríos y cuencas abastecedoras

Todos los macroproyectos aplican en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

2.1.6 CONSTRUCCIÓN DE CORREDORES AMBIENTALES

#SOMOS agua

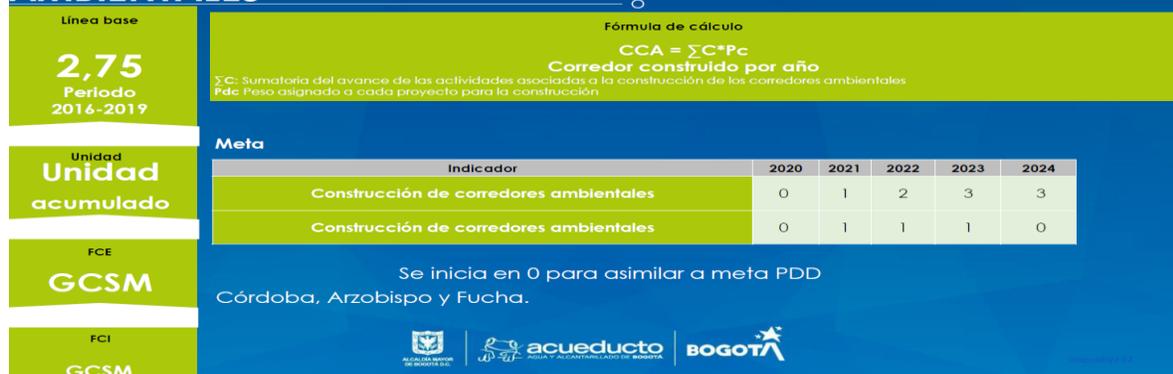

En desarrollo de lo anterior, se revisaron los compromisos e indicadores suscritos por la Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente y la Gerencia General para la vigencia 2022 encontrando lo siguiente:

- Compromiso “TERMINAR UNIDADES INTERVENCIONES EN CORREDORES AMBIENTALES”
- Indicador Estratégico “CONSTRUCCIÓN CORREDORES AMBIENTALES”

SUSCRIPCIÓN ACUERDO DE GESTIÓN

NATALIA ESCOBAR CARREÑO - GERENCIA CORPORATIVA SISTEMA MAESTRO Y CRISTINA ARANGO OLAYA - GERENCIA GENERAL

Las partes que suscriben este Acuerdo lo hacen entendiendo que este instrumento constituye una forma de evaluar la gestión con base en los compromisos asumidos por su ejecutor según plan de acción y de otra parte mejorar las competencias laborales requeridas.

Las cláusulas que regirán el presente ACUERDO de GESTIÓN son:

PRIMERA: El ACUERDO implica la voluntad expresa del EJECUTOR DEL ACUERDO de trabajar permanentemente por el mejoramiento continuo de los procesos y asegurar su transparencia y calidad. El ejecutor así mismo dará estricto cumplimiento al manual de interventoría y al Sistema Integrado de Gestión que lo respalda, haciéndolo cumplir al interior de sus áreas.

SEGUNDA: El EJECUTOR DEL ACUERDO, se compromete, durante el lapso de la vigencia del mismo, a alcanzar los resultados que se detallan en el presente acuerdo de gestión; así mismo se compromete a poner a disposición de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - ESP sus competencias laborales para contribuir al logro de los objetivos institucionales.

TERCERA: El SUPERIOR JERÁRQUICO se compromete a prestar todo el apoyo necesario al EJECUTOR del presente ACUERDO para desarrollar los compromisos pactados, gestionando las medidas, normas y recursos necesarios. La concreción de los compromisos asumidos por el EJECUTOR DEL ACUERDO quedará sujeta a la disponibilidad de los recursos necesarios.

CUARTA: El presente ACUERDO DE GESTIÓN será objeto de seguimiento periódico y evaluación al finalizar la vigencia. Dicho seguimiento y evaluación se realizará sobre la base de los indicadores de los proyectos y procesos. Las competencias laborales serán objeto de retroalimentación cualitativa por parte del SUPERIOR JERÁRQUICO, para lo cual se utilizará el formato de evaluación que hace parte integral del presente ACUERDO.

QUINTA: Medios de Verificación. El EJECUTOR utilizará como medios de verificación, los indicadores de los proyectos, de procesos y demás proyectos transversales que apliquen.

SEXTA: Las partes suscriben el presente ACUERDO DE GESTIÓN el día 18 del mes de Marzo de 2021, con corte de ejecución a diciembre 31 de 2021.

SÉPTIMA: El presente ACUERDO DE GESTIÓN podrá ser ajustado o modificado de común acuerdo entre las partes.

OCTAVA: En prueba de conformidad se firma el ACUERDO DE GESTIÓN:

NATALIA ESCOBAR CARREÑO
 GERENCIA CORPORATIVA SISTEMA MAESTRO

CRISTINA ARANGO OLAYA
 GERENCIA GENERAL

SUSCRIPCIÓN ACUERDO DE GESTIÓN

NATALIA ESCOBAR CARREÑO - GERENCIA CORPORATIVA SISTEMA MAESTRO Y CRISTINA ARANGO OLAYA - GERENCIA GENERAL

Las partes que suscriben este Acuerdo lo hacen entendiendo que este instrumento constituye una forma de evaluar la gestión con base en los compromisos asumidos por su ejecutor según plan de acción y de otra parte mejorar las competencias laborales requeridas.

Las cláusulas que regirán el presente ACUERDO de GESTIÓN son:

PRIMERA: El ACUERDO implica la voluntad expresa del EJECUTOR DEL ACUERDO de trabajar permanentemente por el mejoramiento continuo de los procesos y asegurar su transparencia y calidad. El ejecutor así mismo dará estricto cumplimiento al manual de interventoría y al Sistema Integrado de Gestión que lo respalda, haciéndolo cumplir al interior de sus áreas.

SEGUNDA: El EJECUTOR DEL ACUERDO, se compromete, durante el lapso de la vigencia del mismo, a alcanzar los resultados que se detallan en el presente acuerdo de gestión; así mismo se compromete a poner a disposición de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - ESP sus competencias laborales para contribuir al logro de los objetivos institucionales.

TERCERA: El SUPERIOR JERÁRQUICO se compromete a prestar todo el apoyo necesario al EJECUTOR del presente ACUERDO para desarrollar los compromisos pactados, gestionando las medidas, normas y recursos necesarios. La concreción de los compromisos asumidos por el EJECUTOR DEL ACUERDO quedará sujeta a la disponibilidad de los recursos necesarios.

CUARTA: El presente ACUERDO DE GESTIÓN será objeto de seguimiento periódico y evaluación al finalizar la vigencia. Dicho seguimiento y evaluación se realizará sobre la base de los indicadores de los proyectos y procesos. Las competencias laborales serán objeto de retroalimentación cualitativa por parte del SUPERIOR JERÁRQUICO, para lo cual se utilizará el formato de evaluación que hace parte integral del presente ACUERDO.

QUINTA: Medios de Verificación. El EJECUTOR utilizará como medios de verificación, los indicadores de los proyectos, de procesos y demás proyectos transversales que apliquen.

SEXTA: Las partes suscriben el presente ACUERDO DE GESTIÓN el día 31 del mes de Marzo de 2022, con corte de ejecución a diciembre 31 de 2022.

SÉPTIMA: El presente ACUERDO DE GESTIÓN podrá ser ajustado o modificado de común acuerdo entre las partes.

OCTAVA: En prueba de conformidad se firma el ACUERDO DE GESTIÓN:

NATALIA ESCOBAR CARREÑO
GERENCIA CORPORATIVA SISTEMA
MAESTRO

CRISTINA ARANGO OLAYA
GERENCIA GENERAL

Conforme a lo expuesto anteriormente, el equipo auditor evidenció un posible retraso en el cumplimiento del indicador asociado a la meta sectorial 205 del Plan Distrital de Desarrollo 2020-2024, por cuanto se planificó la construcción de tres corredores ambientales para la ciudad, contrario al señalamiento de 3 unidades intervenciones en Corredores Ambientales.

Ahora bien, es de resaltar que se han comprometido recursos por un valor de \$381.310.004.639 desde el año 2016 y a la fecha se cuenta sólo con un (1) corredor construido denominado Parque Lineal Arzobispo.

Claramente, se encuentran cuatro (4) corredores que requieren actuaciones administrativas por parte de la Empresa como lo son:

- Parque Lineal Córdoba: Contrato de obra civil 1-01-25100-1436-2019, el cual cuenta con querrela policiva en la Alcaldía local de Suba, en asignación de radicado por la Inspección.
- Parque Lineal Río Tunjuelo: Contrato de Consultoría 1-02-25100-1163-2017 - acción de controversias contractuales Tribunal Administrativo de Cundinamarca proceso 11001334306220220013300 y el contrato de obra civil 1-02-25100-1163-2017 - aún no proceden acciones judiciales toda vez que la GCSM dio un alcance a la solicitud respecto al acta de entrega y recibo final que presuntamente venció el plazo el 20 de diciembre de 2022.

- Parque Lineal Jaboque: Contrato de consultoría 1-02-25100-0702-2017 - acción de controversias contractuales Tribunal Administrativo de Cundinamarca proceso 25000233600020210007900, y el contrato de obra civil 1-01-25100-1455-2018 con asignación de apoderado, proyecto de demanda elaborada y solicitud al equipo de corredores de un informe sobre la tasación de perjuicios.
- Parque Lineal Juan Amarillo: Contrato de obra civil 1-01-25100-0648-2018 acción de controversias contractuales Tribunal Administrativo de Cundinamarca proceso 25000233600020220032300.

Valga la pena anotar, que de lo evidenciado en los siguientes corredores denominados como: Parque Lineal Río Fucha, Sendero de las Mariposas, Parque Regional San Rafael y Parque del indio presentan incertidumbre respecto a la etapa de construcción.

Conforme a lo expuesto, se determinó así una observación de la auditoría llevada a cabo.
